


ALLEGATO 6

Cronoprogramma dei lavori


(prot. 95714 del 14/02/2020)

Cronoprogramma Matrice Suolo

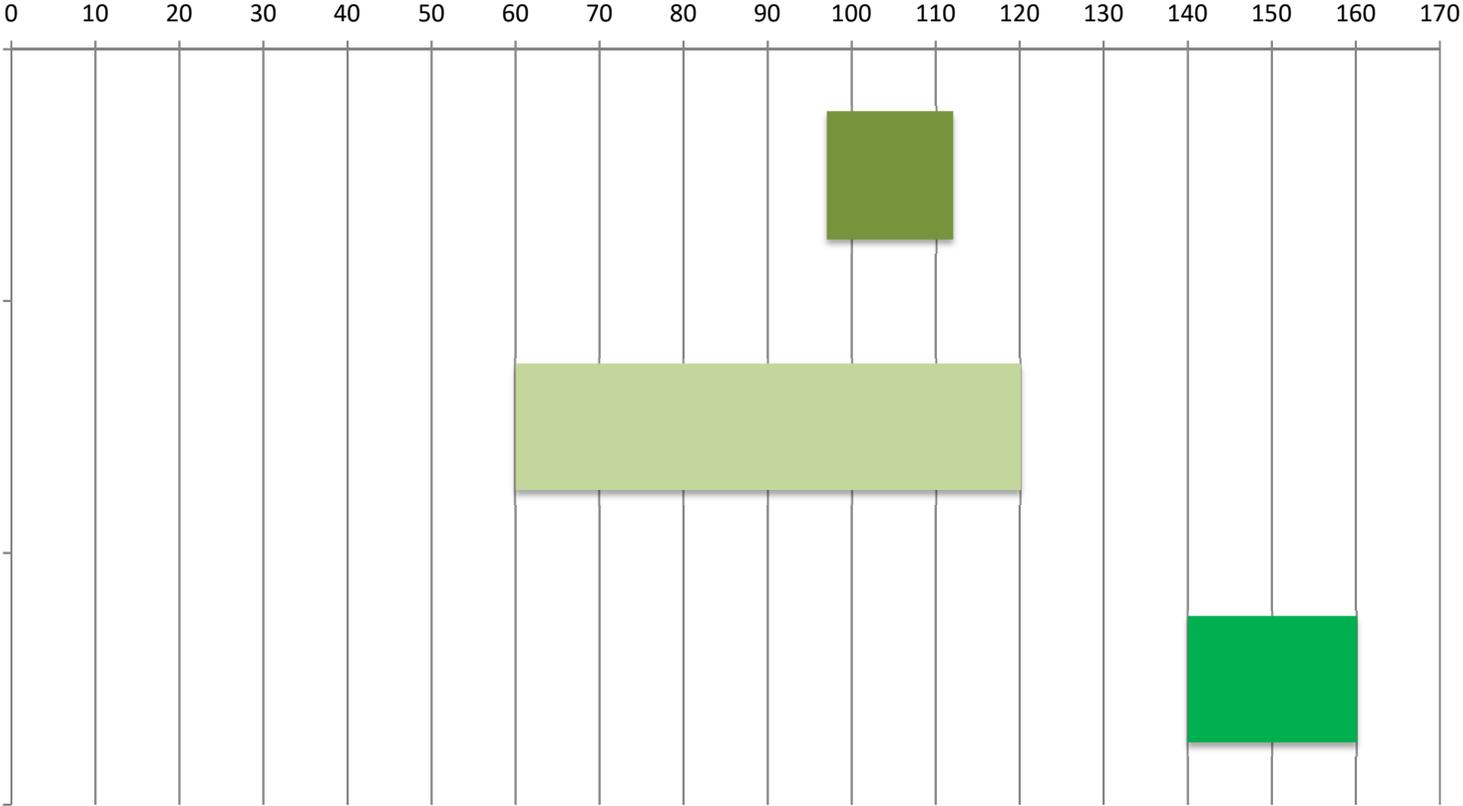


Titolo attività	Inizio	Fine	Durata (giorni)
Manutenzione piazzali al termine dei lavori di scavo e posizionamento vasche e canalette di raccolta acque meteoriche	97	112	15
indagini preliminari secondo All. 11 al Piano Regionale delle Bonifiche	60	120	60
realizzazione barriera vegetale di alloro	140	160	20

Cronoprogramma Matrice Rumore

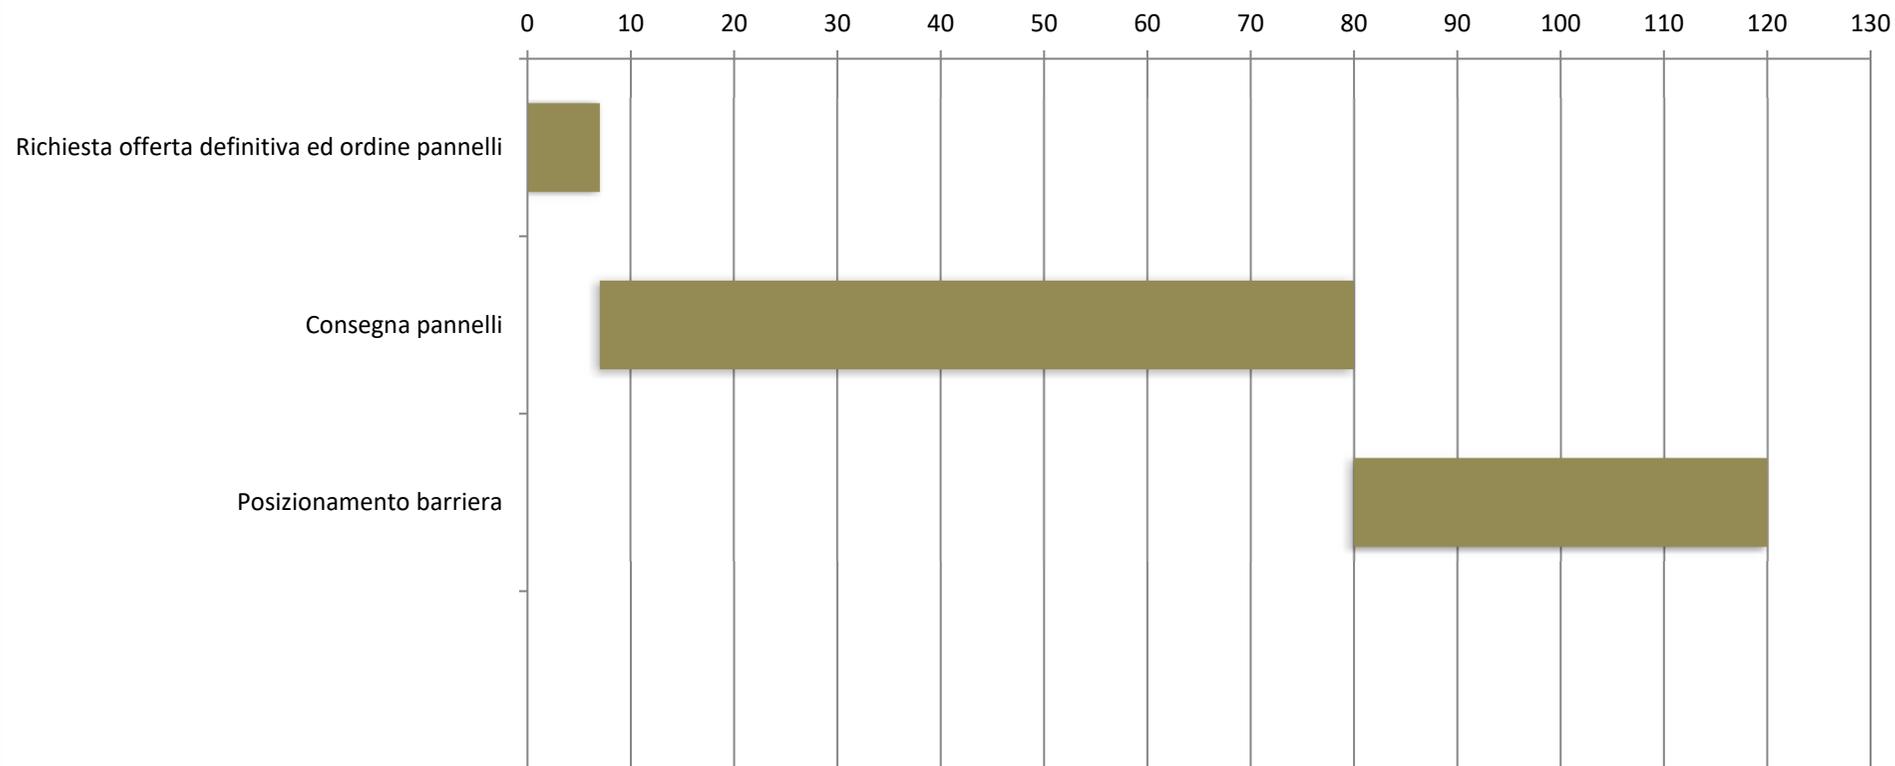

Titolo attività	Inizio	Fine	Durata (giorni)
Richiesta offerta definitiva ed ordine pannelli	0	7	7
Consegna pannelli	7	80	73
Posizionamento barriera	80	120	40

Cronoprogramma Matrice Aria

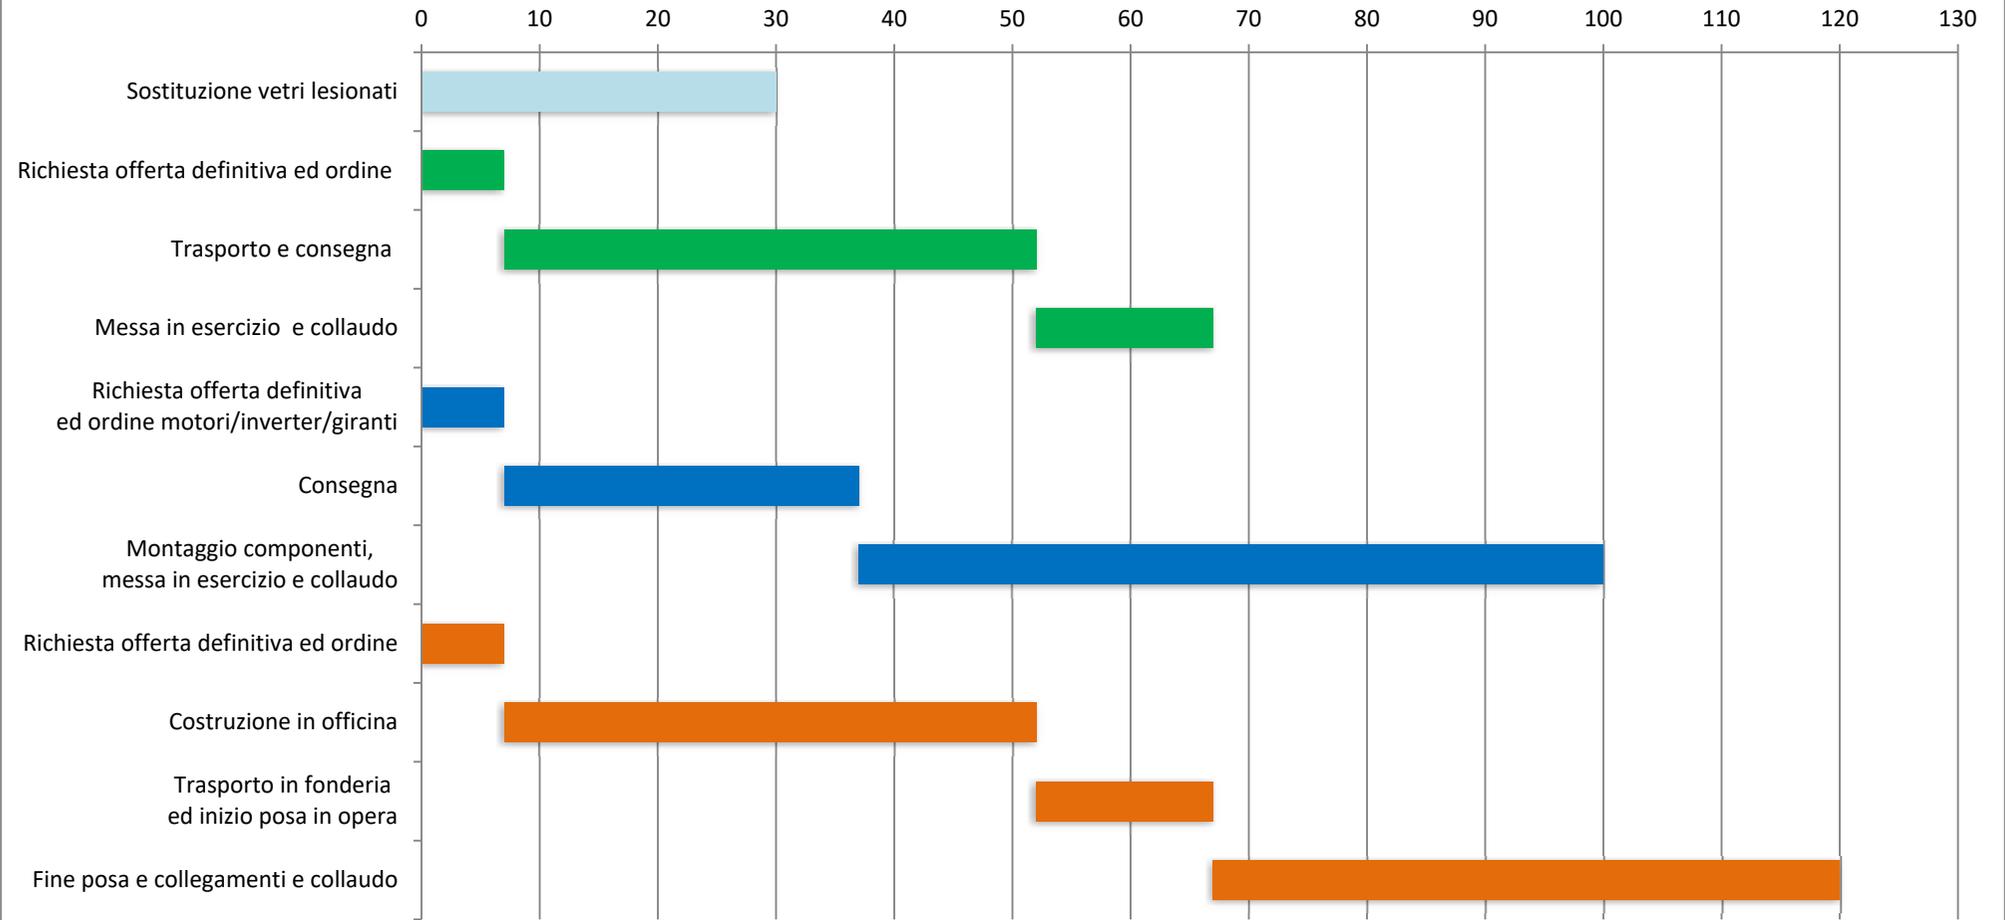


LEGENDA

- Sostituzione vetri lesionati
- Installazione di un controllo in continuo sui cubilotti
- Potenziamento degli impianti di aspirazione
- Torre di reazione per la mitigazione degli impatti odorigeni

Titolo attività	Inizio	Fine	Durata (giorni)
Sostituzione vetri lesionati	0	30	30
Richiesta offerta definitiva ed ordine	0	7	7
Trasporto e consegna	7	52	45
Messa in esercizio e collaudo	52	67	15
Richiesta offerta definitiva ed ordine motori/inverter/giranti	0	7	7
Consegna	7	37	30
Montaggio componenti, messa in esercizio e collaudo	37	100	63
Richiesta offerta definitiva ed ordine	0	7	7
Costruzione in officina	7	52	45
Trasporto in fonderia ed inizio posa in opera	52	67	15
Fine posa e collegamenti e collaudo	67	120	53

Cronoprogramma Matrice Acqua

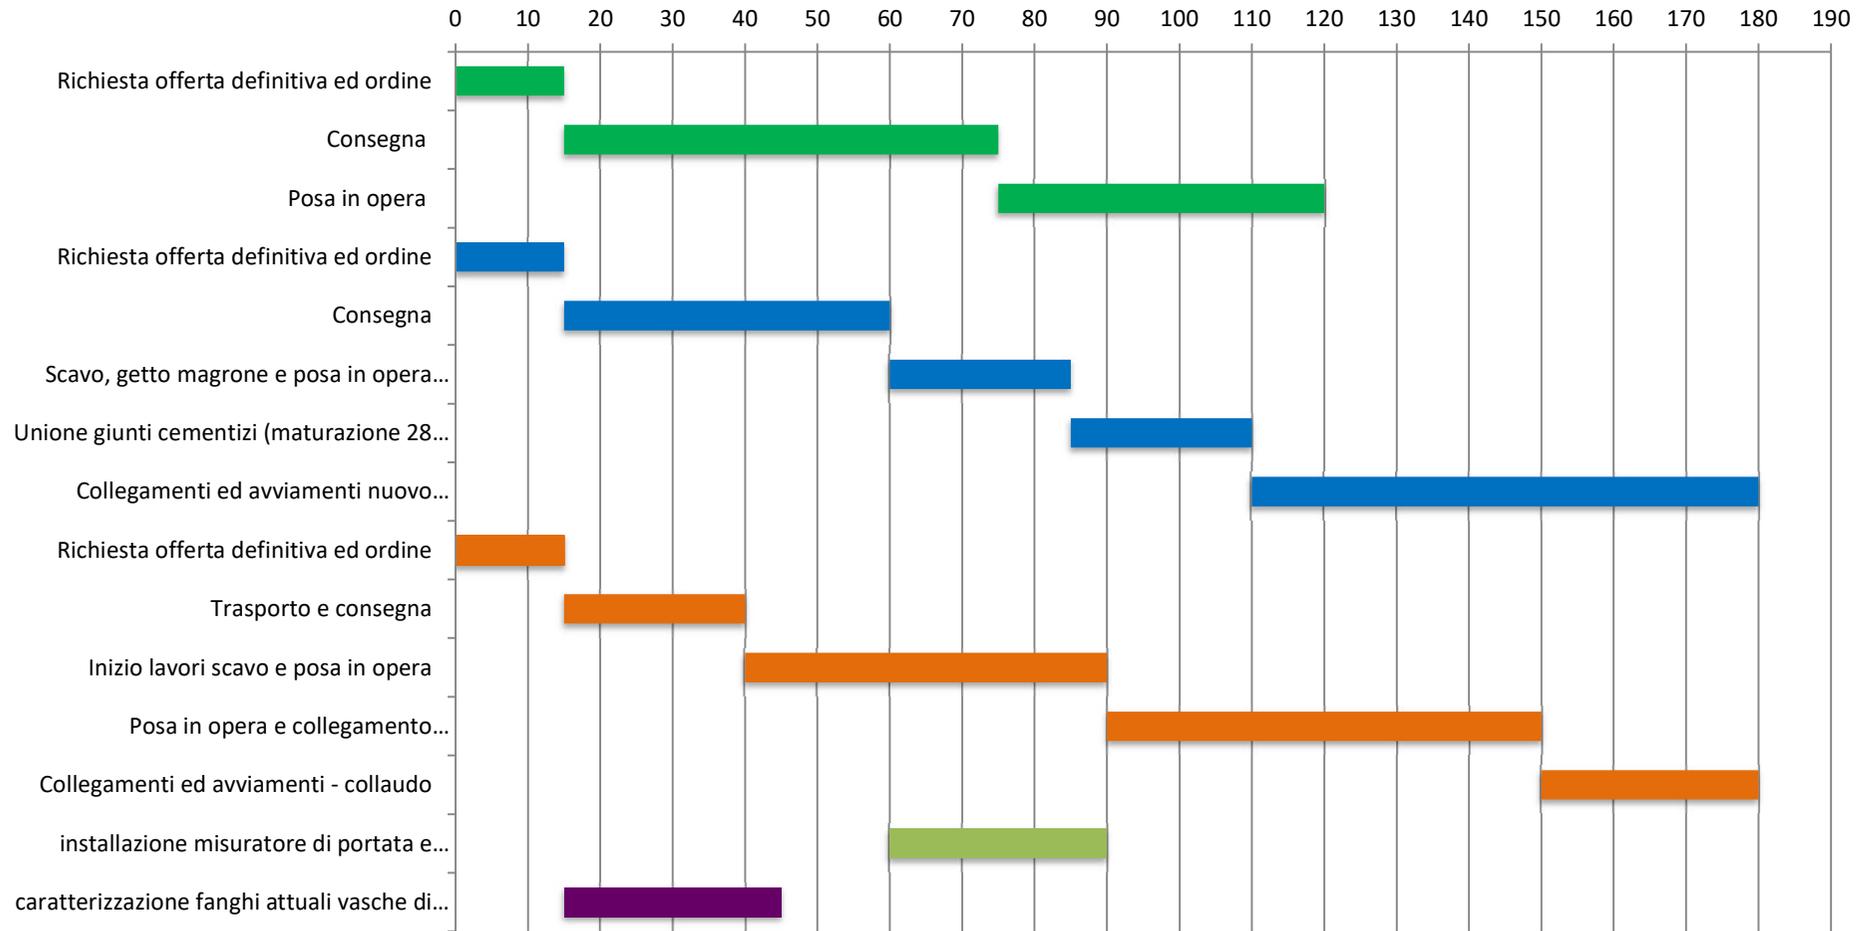


LEGENDA

- Costruzione di un impianto di trattamento chimico-fisico
- Nuove vasche di accumulo e sedimentazione
- Potenziamento della rete di raccolta acque meteoriche con canaletta di raccolta area parcheggio

Titolo attività	Inizio	Fine	Durata (giorni)
Richiesta offerta definitiva ed ordine	0	15	15
Consegna	15	75	60
Posa in opera	75	120	45
Richiesta offerta definitiva ed ordine	0	15	15
Consegna	15	60	45
Scavo, getto magrone e posa in opera vasche	60	85	25
Unione giunti cementizi (maturazione 28 gg)	85	110	25
Collegamenti ed avviamenti nuovo layout e rimozione pozzetti vecchio layout - collaudo	110	180	70
Richiesta offerta definitiva ed ordine	0	15	15
Trasporto e consegna	15	40	25
Inizio lavori scavo e posa in opera	40	90	50
Posa in opera e collegamento con giunti cementizi (28 gg di maturazione)	90	150	60
Collegamenti ed avviamenti - collaudo	150	180	30

Titolo attività	Inizio	Fine	Durata (giorni)
atto di impegno volontario (cadenza annuale)	0	30	30
caratterizzazione sedimenti fluviali	60	120	60

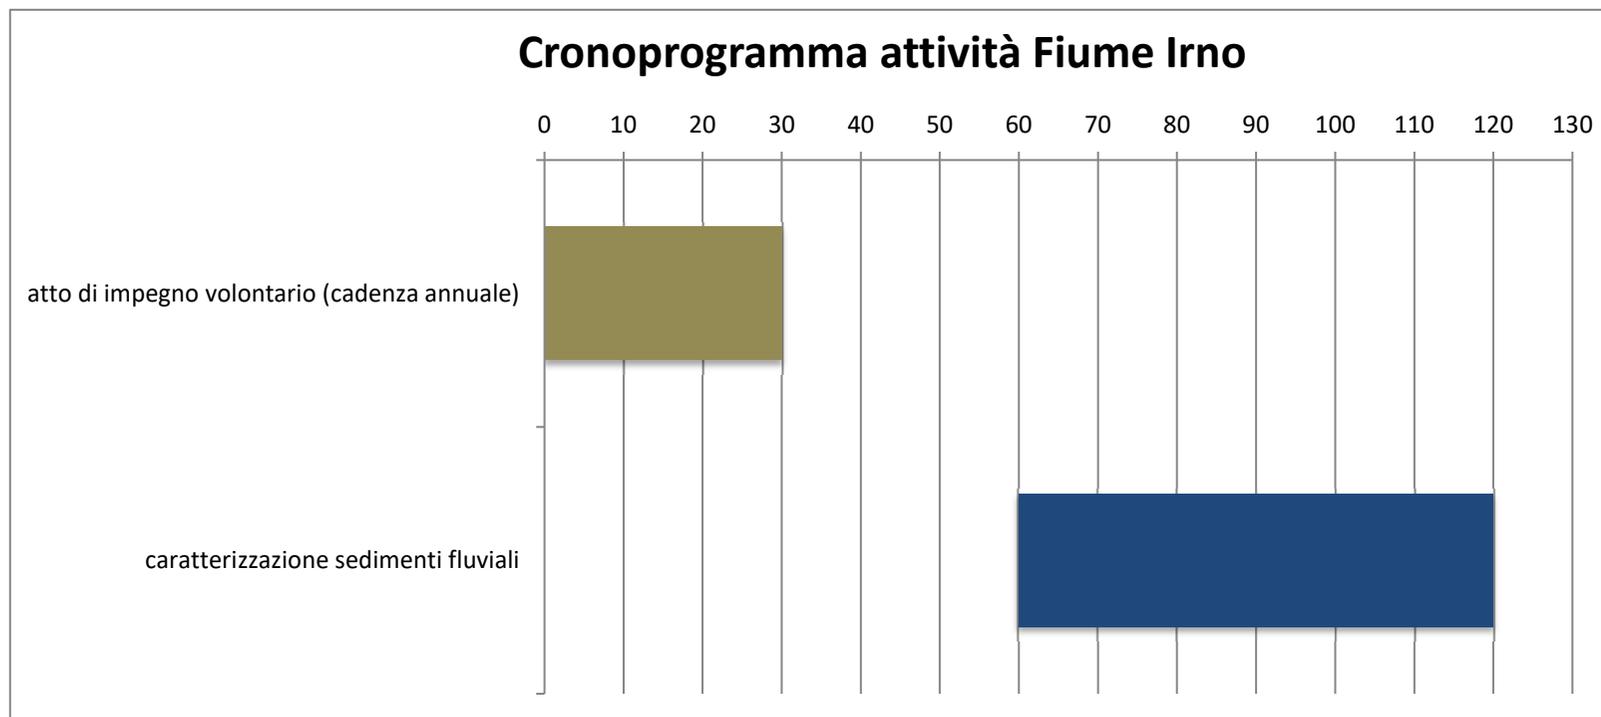

Titolo attività	Inizio	Fine	Durata (giorni)
pubblicazione dati sul proprio sito INTERNET delle attività previste	60	160	100

Cronoprogramma attività di pubblicazione dati

